# DIAGRAMME DE GANTT

SAE 2.05 GESTION D'UN PROJET

13 JUIN 2022

MAITROT TEO & RODRIGUES HUGO
B2

## Liste des tâches

| | Mode Tâche | Nom de la tâche | Durée | Début | Fin | Prédécesseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Réunion de lancement du projet | 1 jour | Jeu 21/01/21 | Jeu 21/01/21 | |
| 2 | | Mise en place du lieu de travail | 2 jours | Ven 22/01/21 | Lun 25/01/21 | 1 |
| 3 | | Création de la charte graphique / Ergonomie | 6 jours | Ven 22/01/21 | Ven 29/01/21 | 1 |
| 4 | | Création architecture du site Web | 7 jours | Ven 22/01/21 | Lun 01/02/21 | 1 |
| 5 | | Réalisation de l'Interface Homme Machine du site | 62 jours | Mar 02/02/21 | Mer 28/04/21 | 3;4 |
| 6 | | Implémentation des fonctionnalités (rendez-vous, agenda...) | 55 jours | Mar 02/02/21 | Lun 19/04/21 | 4 |
| 7 | | Réunion générale sur l'avancée du projet | 1 jour | Jeu 29/04/21 | Jeu 29/04/21 | 6;5 |
| 8 | | Réunion interne développement | 1 jour | Ven 30/04/21 | Ven 30/04/21 | 7 |
| 9 | | Réunion interne graphique | 1 jour | Ven 30/04/21 | Ven 30/04/21 | 7 |
| 10 | | Finition/corrections développement | 25 jours | Lun 03/05/21 | Ven 04/06/21 | 8 |
| 11 | | Finition/corrections graphique | 33 jours | Lun 03/05/21 | Mer 16/06/21 | 9 |
| 12 | | Validation interne (développement, graphistes) du site Web | 1 jour | Jeu 17/06/21 | Jeu 17/06/21 | 10;11 |
| 13 | | Validation par la mairie | 1 jour | Ven 18/06/21 | Ven 18/06/21 | 12 |
| 14 | | Formation des employés de la mairie sur l'utiisation du CMS | 7 jours | Lun 21/06/21 | Mar 29/06/21 | 13 |
| 15 | | Déploiement du site | 2 jours | Lun 21/06/21 | Mar 22/06/21 | 13 |
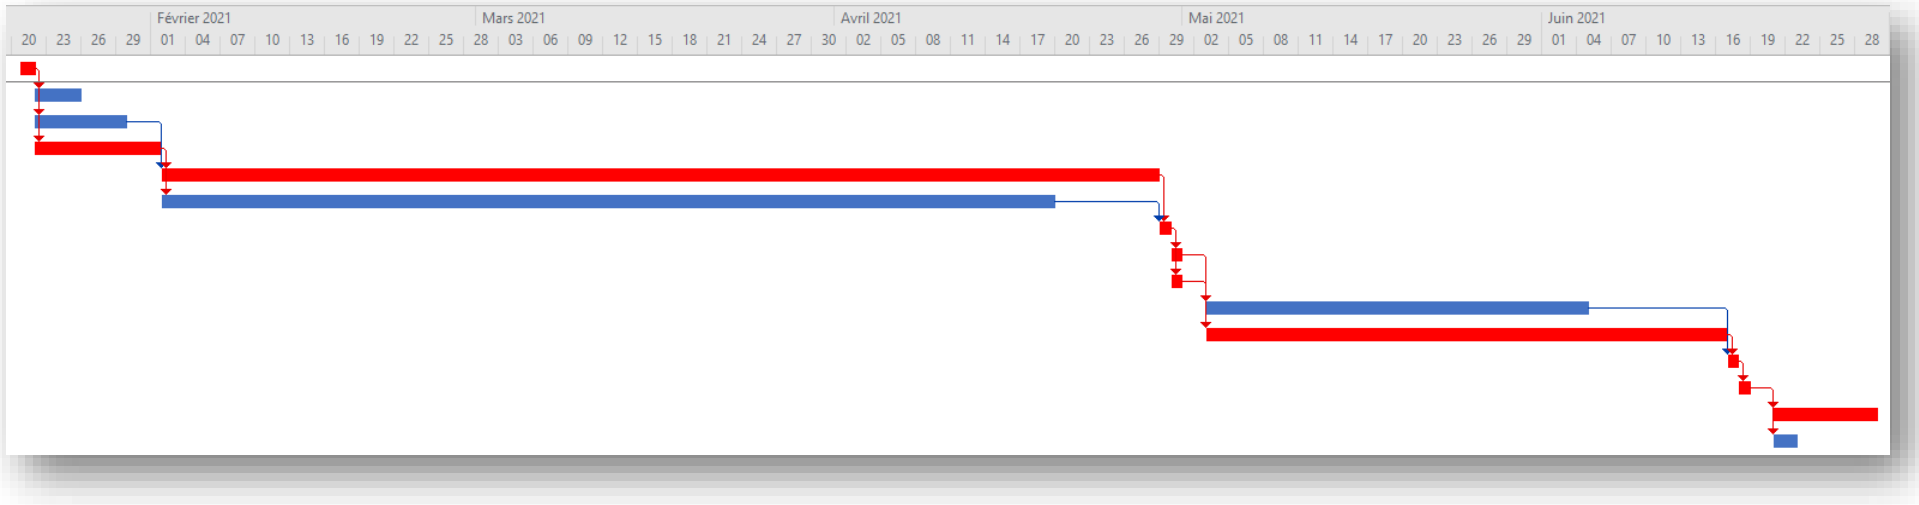
## Rendu avec chemin critique
